



东莞理工学校

DongGuan Science & Technology School

中等职业教育“双精准”示范专业建设
汽车运用与维修专业

8. 1. 10 广汽传祺学院

“祺才计划”校企合作项目建设实施工
作进度汇报

东莞理工学校汽车运用与维修专业项目建设小组

东莞理工学校“棋才计划”校企合作项目


场地建设完结工作总结

— 2021.06.08

序号	事项	内容	时间	完成状况
1	实训中心场地建设	室内装饰及地面处理	2021/6/2-2021/6/5	已完成
VR实训区				
				
整车实训区				
				



模块化教学区

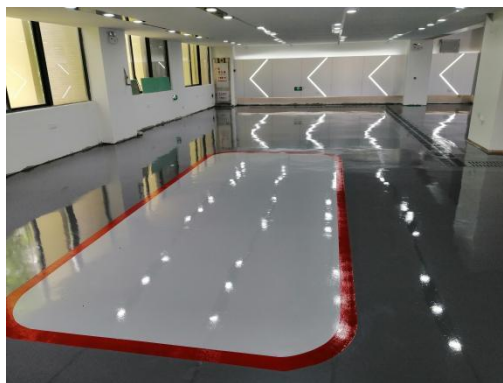

2

场地建设验收

2021/6/5--2021/6/
7

已完成

玻璃幕墙及通道改造



二楼理论教学区域



一楼实训教学区域

					
		3	室内 VI		(根据疫情调整)
		4	室外 LOGO		(根据疫情调整)
		5	车辆、教具入场		(根据疫情调整)
3	签约授牌	1	签约授牌仪式	计划	6月中下旬(根据疫情调整)
		2	教学资源包赠予仪式	计划	6月中下旬(根据疫情调整)
4	专业教学方案建设	1	教学方案建设	教学大纲	6月中下旬(根据疫情调整)
		2	教学方案建设	教学课程内容汇总	
		3	教学方案建设	教学课件编写	
		4	教学方案建设	其他教学资源建设	

5	师资力量培训	1	第一期师资力量培训		6月下旬（根据疫情调整）
---	--------	---	-----------	--	--------------
